

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Entidad Federativa: Seleccione el estado
Municipio: Seleccione el municipio
Tipo de recurso: Seleccione el Tipo de Recurso
Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo
Ramo: Seleccione el Ramo
Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Consultar
Limpiar

Ir al Inicio Descargar consulta

5 proyectos

legoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
yecto de inversión	OAX210201940788	TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL <small>En registro de avances</small>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD DEL MAR	Registrar Avance
yecto de inversión	OAX210201941077	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO <small>En registro de avances</small>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD DEL MAR	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Se han encontrado: 382 proyectos.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción
 Adquisición
 Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Institución Ejecutora UNIVERSIDAD DEL MAR
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Estado Responsable Oaxaca
Clasificación del registro Educación	Municipio Responsable Gobierno de la Entidad
Subclasificación del registro Sin identificar	Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? SI No
Periodo de ejecución 23/06/2021 - 19/11/2021	Mujeres 396

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO”

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos F... UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable
Oaxaca

Clasificación del registro
Educación

Municipio Responsable
Gobierno de la Entidad

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiaria
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución
23/06/2021 - 19/11/2021

Mujeres
396

Hombres
185

Número de Registro
LPO-920047989-E2-2021

Metas
[+ Agregar](#)

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	860.63	860.63	Editar	Eliminar

Geolocalización
Tipo de Georreferencia: Punto(s) Independiente(s)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahías De Huatulco	Acapulco - Salina Cruz, Santa Cruz Huatulco, Garita, Oax., México	15.78040142/-96.16034210	Eliminar

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos F... UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

[+ Agregar](#)



Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	860.63	860.63	Editar	Eliminar

Geolocalización
Tipo de Georreferencia: Punto(s) Independiente(s)

[Agregar georreferencia](#)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahías De Huatulco	Acapulco - Salina Cruz, Santa Cruz Huatulco, Garita, Oax., México	15.78040142/-96.16034210	Eliminar

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

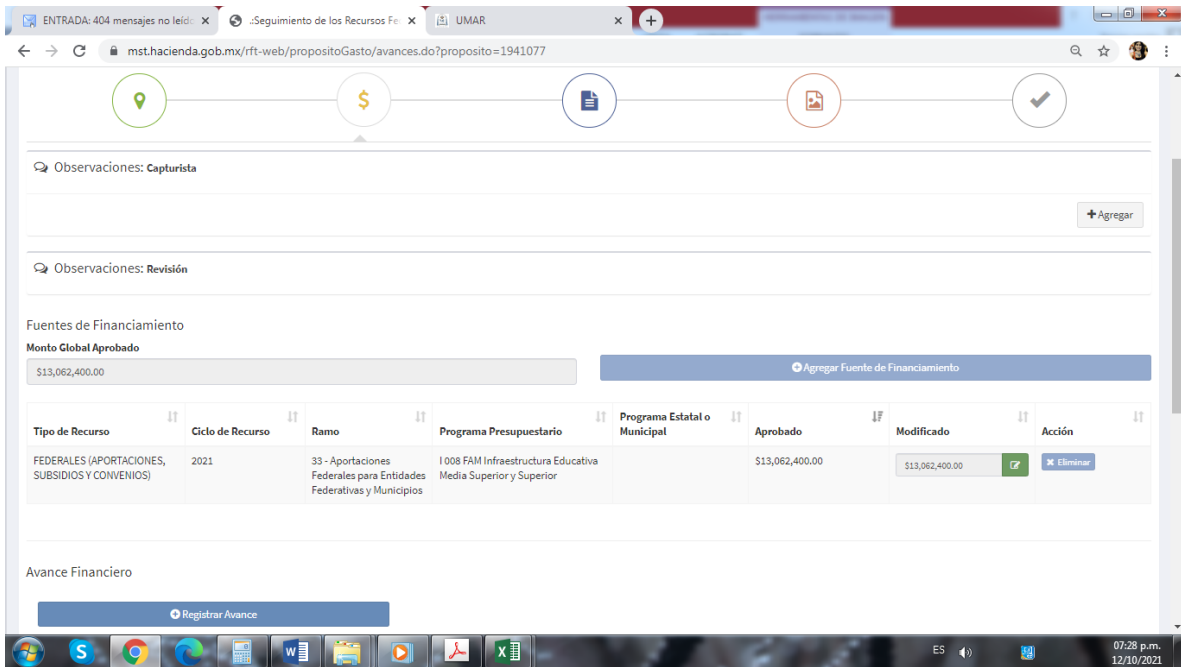

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 Meta Modificada: 860.63 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **0.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 Meta Modificada: 860.63 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **0.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

Avance Financiero

Recaudado: ✓

Comprometido: ✓

Devengado: ✓

Ejercido: ✓

Pagado: ✓

[Cancelar](#) [Aceptar](#)

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fiscales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$6,792,448.00	\$13,062,400.00	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	38.23309%	Editar
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 0.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 Meta Modificada: 860.63 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 0.00 %

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Confirmado

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fiscales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$6,792,448.00	\$13,062,400.00	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	38.23309%	Editar
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 0.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 Meta Modificada: 860.63 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 0.00 %

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Confirmado

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

Avance Físico

Avance:

Cancelar Aceptar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$6,792,448.00	\$13,062,400.00	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	38.23309%	Editar
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **38.30 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 Meta Modificada: 860.63 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **38.30%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	329.62	38.3%	Editar
2021 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

07:34 p.m. 12/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Observaciones: **Capturista** [Agregar](#)

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

[Buscar por Folio](#)

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93	Ver detalles	Eliminar

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

07:36 p.m. 12/10/2021

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Contrato

RFC del convocante UMAS20905440	Nombre del convocante UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista IIT120323PL6	Nombre del contratista INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
Fecha de Firma del Contrato 2021-06-22	Monto del contrato \$11,788,556.93
Número de procedimiento LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado \$11,788,556.93
¿Existe anticipo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Anticipo \$3,536,567.07	
Tipo de Contratación Obra	Modalidad de Contratación Licitación pública nacional
Descripción del contrato CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Número del contrato LPO-920047989-E2-2021
Liga del contrato	

07:37 p.m. 12/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Número de procedimiento LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado \$11,788,556.93
¿Existe anticipo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Anticipo \$3,536,567.07	
Tipo de Contratación Obra	Modalidad de Contratación Licitación pública nacional
Descripción del contrato CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Número del contrato LPO-920047989-E2-2021
Liga del contrato https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E2/Contrato%20E2.pdf	
Estatus del contrato Contrato vigente	Fecha de conclusión 2021-11-19
Liga documento de evidencia URL del documento de evidencia de término	

Cerrar

07:37 p.m. 12/10/2021

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Buscar Contrato

Folio de Contrato o Administración Directa: Presiona el botón para realizar la búsqueda

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,273,843.07	\$1,273,843.07

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93	Ver detalles	Eliminar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

07:39 p.m. 12/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · ADENDUM E2.pdf

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,273,843.07	\$1,273,843.07	Ver detalles	Eliminar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

07:45 p.m. 12/10/2021

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Seguimiento de los Recursos Federales | UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

SHCP

Registros de Avances Individuales

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato

Buscar por

Tipo de contratación	Número
Obra	LPO-920047989-2021

Contrato

RFC del convocante UMAS20905440	Nombre del convocante UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista IIT120323PL6	Nombre del contratista INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
Fecha de Firma del Contrato 2021-06-22	Monto del contrato \$1,273,843.07
Número de procedimiento AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado \$1,273,843.07
¿Existe anticipo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Anticipo Sin anticipo	
Tipo de Contratación Obra	Modalidad de Contratación Licitación pública nacional
Descripción del contrato ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Número del contrato AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021
Liga del contrato	

07:41 p.m. 12/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Seguimiento de los Recursos Federales | UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

SHCP

Registros de Avances Individuales

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato

Buscar por

Tipo de contratación	Número
Obra	LPO-920047989-2021

Contrato

Número de procedimiento AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado \$1,273,843.07
¿Existe anticipo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Anticipo Sin anticipo	
Tipo de Contratación Obra	Modalidad de Contratación Licitación pública nacional
Descripción del contrato ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Número del contrato AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021
Liga del contrato https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E2/ADENDUM%20E2.pdf	
Estatus del contrato Contrato vigente	Fecha de conclusión 2021-11-19
Liga documento de evidencia URL del documento de evidencia de término	

Cerrar

07:41 p.m. 12/10/2021

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · ADENDUM E2.pdf

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Emitir Observación

Observación

AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021 ES UN ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO LPO-920047989-E2-2021 PARA COMPROMETER EN UN 100% EL MONTO APROBADO DE 13,062,400.00

Cancelar Aceptar

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,273,843.07	\$1,273,843.07	Ver detalles	Eliminar

07:52 p.m. 12/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · ADENDUM E2.pdf

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Observaciones: Capturista

flordelenc - Capturista

AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021 ES UN ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO LPO-920047989-E2-2021 PARA COMPROMETER EN UN 100% EL MONTO APROBADO DE 13,062,400.00

12/10/2021 12:59:04 PM

Eliminar Agregar

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,273,843.07	\$1,273,843.07	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93	Ver detalles	Eliminar

07:59 p.m. 12/10/2021

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (5) - flordelizbelacruz | Seguimiento de los Recursos Fiscales

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar

Desarrollo

Clic para seleccionar

(o Arrastra los archivos aquí)


ES 05:51 p.m. 13/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (5) - flordelizbelacruz | Seguimiento de los Recursos Fiscales

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Eliminar

Desarrollo



Eliminar

Eliminar

Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

ES 05:56 p.m. 13/10/2021

3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Período: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

flordbelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
OAX210201941077

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Suspensión

05:56 p.m. 13/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

06:00 p.m. 13/10/2021

REPORTE FINAL AL 3ER TRIMESTRE EN RENDICIÓN DE CUENTAS- SRFT

Transparencia Presupuestaria - R x +

https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Inicio Marco Regulatorio Marco Programático Presupuestal Costos Operativos Rendición de Cuentas Evaluación de Resultados Estadísticas Fiscales

SEFIN Secretaría de Finanzas SCTG Secretaría de Hacienda y Transparencia Subsecretaría

Transparencia Presupuestaria

Rendición de Cuentas

Periodico Oficial Cuenta Pública Informes anuales de Gobierno Informes Trimestrales de Finanzas Publicas Deuda Pública

Calificaciones Soberanas Cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) antes Formato Único de Aplicación de Recursos Federales

Sistema de consulta de las Participaciones Federales entregadas a municipios Obras a realizar recursos FAIS Dictámenes de Estados Financieros

Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas del Estado Programa Operativo Anual Seguimiento a Gasto de Operación

Transferencias de Recursos Federales a Municipios Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Oaxaca (REFOO)

Registro Público de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios

Transparencia Presupuestaria - R x +

https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html

Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
DESTINO DEL GASTO																					
Avances Físicos																					
Contratos																					
Fuentes de Financiamiento																					
Georreferencias																					
Metas																					
Reporte Final (En el Excel de datos abiertos incluye los apartados de avances físicos, contratos, fuente de financiamiento, georreferencias y metas)																					

www.finanzasoxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/informes/PASH/2021/excel/3_TRIM_DG_Reporte Final.xlsx

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
OAX210201941077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		13062400	13062400

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
OAX210201941077	Metros Cuadrados	860.63	860.63

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
OAX210201941077	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahías De Huatulco [Aeropuerto Internacional]	Acapulco - Salina Cruz, Santa Cruz Huatulco, Garita, Oax., México	-96.160342	15.7804014

FOLIO	TIPO DE	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
OAX210201941077	Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	1273843.07	1273843.07
OAX210201941077	Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	11788556.9	11788556.93

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX210201941077	2021		3 Metros Cuadrados	860.63	860.63	329.62	38.29985011
